

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ



2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

MART-2013
OSMANİYE

İÇİNDEKİLER

TABLolar VE ŞEKİLLER	4
YÖNETİCİ SUNUMU	5
1. GENEL DEĞERLENDİRME	7
1.1. Kuruluşun Misyonu	7
1.2. Kuruluşun Vizyonu	7
1.3. Temel Değerlerimiz	7
1.4. Kuruluşun Temel Amaçları	7
1.5. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	8
1.6. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları	9
1.7. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi	11
1.9. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları	16
1.10. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar	17
2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI	18
2.1. Devam Eden Kamu Yatırım Projeleri	18
2.1.1. 2009H032130 Kampus Altyapısı	18
2.1.2. 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	19
2.1.3. 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler	20
2.1.4. Kamulaştırma Giderleri	21
2.1.5. 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu	22
2.1.6. 2010K121290DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı	23
2.1.7. 2011H036050 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	24
2.1.8. 2012H032700 Muhtelif İşler Projesi	25
3. ÖNERİLER	30

TABLolar VE ŞEKİLLER

Tablolar

Tablo 1 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı(TL).....	9
Tablo 2 Üniversitemiz 2012 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (TL).....	10
Tablo 3 Üniversitemiz 2012 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılım ve Oranları (TL).....	10
Tablo 4 2012 Yılı Mevcut Fiziki Kapalı Alanların M ²	12
Tablo 5 2013 Yılında Açılması Planlanan Fiziki Kapalı Alanların M ²	13
Tablo 6 Öğrenci Sayıları.....	13
Tablo 7 Akademik ve İdari Personel Sayıları (2012 yılı sonu itibariyle).....	14
Tablo 8 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı.....	16
Tablo 9 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2012 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.....	16
Tablo 10 Yerleşke Altyapısı Projesi.....	18
Tablo 11 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	19
Tablo 12 Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi.....	20
Tablo 13 Kamulaştırma Giderleri.....	21
Tablo 14 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi.....	22
Tablo 15 DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi.....	23
Tablo 16 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	24
Tablo 17 Muhtelif İşler Projesi(Kurum Geneli).....	25
Tablo 18 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....	26
Tablo 19 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....	27
Tablo 20 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....	28
Tablo 21 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....	29
Tablo 22 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kafeterya İnşaatı.....	29
Tablo 23 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti.....	31
Tablo 24 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Projeleri Listesi.....	32

Şekiller

Şekil 1 Harcama Oranları.....	11
-------------------------------	----

YÖNETİCİ SUNUMU

Son dönemde açılan Üniversitelerle, toplumun büyük bir kesimi Üniversitelerle tanışmıştır. Önceki dönemlerde görevleri yalnızca öğrenci yetiştirmek olarak görülen Üniversitelerin artık topluma faydaları tartışılmaya başlanmıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sınırlı imkânları ile kaliteden ödün vermeden pek çok başarılı projeye imza atmıştır. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüzde, bilgiyi doğru kullanabilecek genç nesilleri yetiştirebilmek için gerekli altyapı yatırımlarına öncelik vermiştir.

Üniversitemiz, akademik yapılanması, idari teşkilatı, fiziki altyapısı ile kendisiyle yaşıt Üniversitelerle rekabet edebilir ve ülkemizin pek çok köklü Üniversitesi ile aynı kulvarda varlığını sürdürebilir hale gelmiştir.

Üniversitemiz hızlı bir şekilde fiziki anlamda da değişmektedir. Son derece modern altyapı ile donattığımız eğitim bloklarımız, merkezi araştırma laboratuvarımız ve merkezi kafeteryamızın yanında; sportif ve kültürel faaliyetler için, kapalı spor salonumuz, FIFA standartlarındaki futbol sahamız, tribünlerimiz, tenis kortlarımız, basketbol-voleybol sahalarımız, squash salonlarımız, konferans salonlarımız sosyal-sportif ve kültürel anlamda hizmetlerini sunmak için hazırlanmıştır. Merkezi araştırma laboratuvarı alt yapısını Osmaniye'nin ve bölgemizin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir düzeye getirmek için çalışmaktayız. Halen inşaatı devam eden 38.000m²'lik Mühendislik Fakültesi Binamızın, alışılmışın dışındaki imkânları ile “öğrenci yaşam merkezi” olarak tasarlanan 14.000m²'lik kütüphanemizin yanında,2013 yılı içerisinde yarı-olimpik kapalı yüzme havuzumuzun da temelini atılması için de büyük gayret sarf ediyoruz.

Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina ve arsa sorunlarının çözülmesi için girişimlerde bulunulmuş ve 2012 yılında kamulaştırma giderleri olarak ayrılan ödenekten OKÜ Karacaoğlan yerleşkesi bitişiğinde bulunan 189-190 parsel numaralı 46.600 m² yüzölçümlü taşınmazların kamulaştırılması işlemi tamamlanmıştır.

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, Ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir.

2012 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1. Kuruluşun Misyonu

Ülkemizin temel değerlerine duyarlı, özgüven sahibi, sürekli gelişimi hedefleyen liderlik ruhuna sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmek, akademik ve idari personelin memnuniyet düzeyini artırmak, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırmaktır.

1.2. Kuruluşun Vizyonu

Nitelikli insan kaynaklarımızla üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sürekli hale getirerek, uluslararası düzeyde rekabet edebilen önder bir üniversite olmaktır.

1.3. Temel Değerlerimiz

İnsan Odaklı: Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma

Bilimsel Özgünlük ve Özgürlük: Tüm paydaşlarını özgür bir düşünce ile bölgenin, ülkenin ve insanlığın sorunlarını çözmeyi ilke edinme

Katılımcı: Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma

Kalite odaklı: Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma

Yenilikçi ve Rekabetçi: Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma: Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme

Adalet ve Eşitlik: Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme

Evrensel Değerleri Esas Alma: Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma

Çevreyi Koruma: Üniversite paydaşlarının, çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olması

1.4. Kuruluşun Temel Amaçları

A.1 Araştırma geliştirme faaliyetleri ile eğitim ve öğretimin daha nitelikli hale getirilebilmesi için fiziki ve sosyal altyapıyı geliştirmek,

A.2 Üniversitenin kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek, tanıtımını sağlamak ve üniversiteden memnuniyeti artırmak,

A.3 Kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan, faaliyet ve hizmetlerinin sonuçlarını izleyen, sürekli iyileştiren ve geliştiren bir üniversite olmak,

A.4 Öğretim elemanları ve öğrencilerimizin eğitim-öğretim açısından nitelik ve niceliklerini artırarak kaliteli eğitim sunmak,

A.5 Eğitim alanındaki teknolojileri takip etmek ve uygulamaya geçmek,

A.6 Eğitim-öğretimi çağın gerektirdiği şekilde daha iyi bir düzeye getirmek,

A.7 Üniversitenin eğitim-öğretim kalitesi bakımından ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak,

A.8 Öğrencilerimiz ve personellerimize kaliteli beslenme, spor ve kültürel hizmetler sunmak,

A.9 Ar-Ge altyapısını geliştirmek,

A.10 Bilimsel projelerin ve yayınların nitelik ve niceliğini geliştirmek,

A.11 Araştırma eğitimini yetkinleştirmek,

A.12 Özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek,

A.13 Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek,

A.14 Üniversite-toplum ilişkilerini güçlendirmektir.

1.5. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

- A) Özel Bütçe
 - a) Hazine Yardımı
 - b) Öz Gelirler
 - 1) Bilimsel Araştırma Proje Gelirleri
 - 2) Kira Gelirleri
 - 3) SKS Gelirleri
 - 4) Birinci Öğretim Gelirleri
 - 5) İkinci Öğretim Gelirleri
 - 6) Yaz Okulu Gelirleri
- B) Döner Sermaye
- C) Bütçe Dışı Kaynak
 - a) TÜBİTAK
 - b) SAN-TEZ
 - c) AB
 - d) BAP
 - e) Şartlı Bağışlardan oluşmaktadır.

Tablo 1 2012 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağı(TL)

2012 YILI YATIRIM PROJELERİNİN FİNANSMAN KAYNAĞI								
Proje No	Projenin Adı	Hazine Yardımı	Net Finansman	BAP Emanet Hesabı	Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen	Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen	Yedek Ödenek	Toplam Kaynak
2012H032690	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	200.000	-			-	-	200.000
2009H032130	Kampus Altyapısı	1.000.000	-			-	-	1.000.000
2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	11.000.000	-		573.748		-	10.426.252
2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesis	1.500.000	-		1.500.000		-	-
2012H032700	Muhtelif İşler	2.000.000	470.000		99.000	219.000	-	2.590.000
2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.898.000	610.000			453.748	-	3.961.748
2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	105.000				-	-	105.000
-	Kamulaştırma	1.300.000	-			1.500.000	-	2.800.000
GENEL TOPLAM		20.003.000	1.080.000		2.172.748	2.172.748		21.083.000

1.6. Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları

Anayasa'nın 130.maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Üniversitemiz yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

- 2547 sayılı yasanın 55.maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
- 2547 sayılı yasanın 46.maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
- 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler,
- 2547 sayılı yasanın Ek 26. maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleridir.


Tablo 2 Üniversitemiz 2012 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (TL)

2012 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yedek Ödenekten Aktarma	Özel Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	İptal Ödenek	Yıl Sonu Harcama
45.254.000.00	2.679.374	1.105.000	90.806	49.129.180	4.751.540	44.354.137

Tablo 3 Üniversitemiz 2012 Yılı Sermaye Giderleri Ekonomik Kod Dağılım ve Oranları (TL)

EKO KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI (harcama/serbest)
06.1	Mamul Mal Alımları	1.389.000	1.389.000	1.386.150	%100
06.2	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	200.000	200.000	133.930	%67
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	101.000	101.000	100.082	% 99
06.4	Gayrimenkul Alımları ve kamulaştırması	2.800.000	2.800.000	2.800.000	%100
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.493.000	15.493.000	13.071.467	%84
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.100.000	1.100.000	1.011.573	%92
	GENEL TOPLAM	21.083.000	21.083.000	18.503.225	%88

Şekil 1 Harcama Oranları

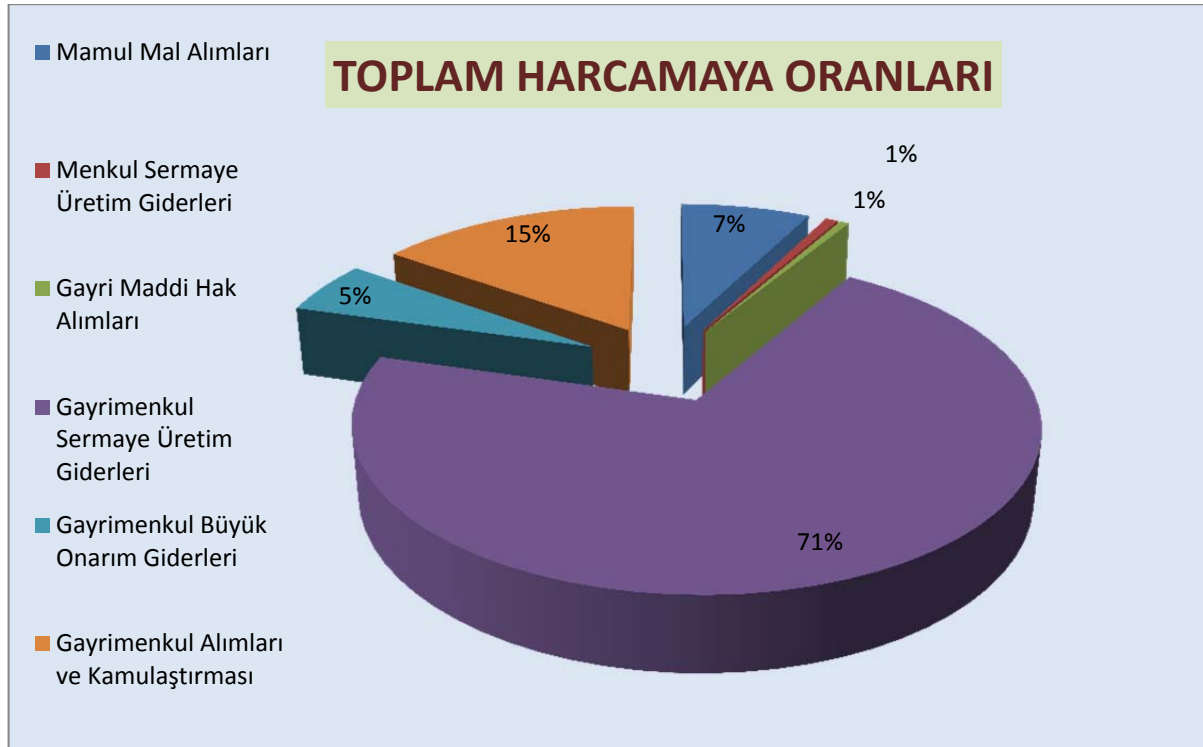

1.7. Üniversitemizin Mevcut Üretim Kapasitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi merkeze yaklaşık 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 595738 m²'si maliye hazinesi olmak üzere, toplam 886.088 m² taşınmaz alana sahiptir. Osmaniye, merkez yerleşkemizde Rektörlük ve İdari Birimler 20650 m², Fen Edebiyat Fakültesi 7690 m², İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5285 m², Mühendislik Fakültesi 7745 m², Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi 2150 m², Fen Bilimleri Enstitüsü 140 m², Sosyal Bilimler Enstitüsü 140 m², Yabancı Diller Yüksekokulu 1500 m², Osmaniye Meslek Yüksekokulu 13050 m², Bahçe Meslek Yüksekokulu 4460 m², Kadirli Meslek Yüksekokulu 4500 m², Düziçi Meslek Yüksekokulu 3320 m², Merkezi Araştırma Laboratuvar Binası 2524 m² kapalı hizmet alanına sahip olup, müstakil merkezlerden; Amfi 2500 m², Park Bahçeler Bakım Binası 200 m², Kütüphane 550 m² ve Personel Dinlenme Salonunun 400 m² lik kapalı alanı ile beraber, kapalı alanlar toplamı 76804 m²'ye ulaşmış bulunmaktadır.

Tablo 4 2012 Yılı Mevcut Fiziki Kapalı Alanların M²

REKTÖRLÜK, FAKÜLTE, ENSTİTÜ, MYO VE TÜM BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR M ²																
	İDARİ ALANLAR				EĞİTİM ALANLARI				SOSYAL ALANLAR				SPOR ALANLARI		SİRKÜLASYON ALANI	TOPLAM	
	Personel Çalışma Alanı	ARŞİV	DEPO	AMBAR	Akademik Personel Çalışma Alanı	ÖĞRENCİ DERSLİĞİ	LABORATUAR		KANTİN	KAFETERYA	LOJMAN	YURTLAR	SAĞLIK	AÇIK SPOR TESİSLERİ (C)			KAPALI SPOR TESİSLERİ
							Mer. Lab.	Öğrenci Lab.									
REKTÖRLÜK																	
Rektörlük İdari Binalar	4260	100	100				3374			8090	1250				3500	2500	20650
FAKÜLTELER																	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	255	140	260		1250	1410		130	300							1540	5285
Fen Edebiyat Fakültesi	330	140	260		1400	2210		1060	350							1940	7690
Mühendislik Fakültesi	305	150	280		1350	2210		1060	350							2040	7745
Mim. Tasarım ve Güzel San. Fak.	100	50	50		150	1350			50							400	2150
ENSTİTÜLER																	
Fen Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
Sosyal Bilimleri Enstitüsü	55					85											140
YÜKSEKOKULLAR																	
Osmaniye MYO	350	100	100		2500	3500		3900	300							2300	13050
Düzici MYO	150	100	100	1510	250	450		60		200						500	3320
Bahçe MYO	200	100	240		350	570		165	175	260		1600				800	4460
Kadirli MYO	400	100	200	140	500	1200		455	100	150						1255	4500
Yabancı Diller Yüksekokulu	200	50	50		300	800										100	1500
MÜSTAKİL MERKEZLER																	
Amfi	2500																2500
Park Bahçeler Bakım Binası	200																200
Kütüphane	550																550
Personel Dinlenme Salonu	400																400
TOPLAM	10310	1030	1640	1650	8050	13870	1800	6830	1625	8700	1250	1600	0	3500	13375	76.804	

Not: (a) Üniversitemiz Merkez Kampus Alanı Toplam= 630 Dekar'dır. MYO'lar Dahil Yerleşke Alanı Toplam = 839 dekar'dır.

Not : (b) Mim. Tasarım ve Güzel San. Fakültesi (C Blok) - Yabancı Diller Yüksekokulu (B Blok).

Not : (c) Açık Spor Tesisi Merkez Yerleşke de 9200 m², MYO'larda 4100 m² olmak üzere toplam= 13300 m² dir.

Tablo 5 2013 Yılında Açılması Planlanan Fiziki Kapalı Alanların M²

BİRİMLER	2013 YILINDA AÇILACAK FİZİKİ KAPALI ALANLAR M ²								
	(*) İDARİ BİNALAR	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			SİRKÜLAS . ALANI	SPOR ALANLARI	
		DERSLİK	LAB.	KANTİN/ KAFE VB	LOJMAN	YURTLAR		AÇIKSPOR TESİSLERİ	KAPALI SPOR TESİSLERİ
Rektörlük ve İdari Binalar		38.000	-					5.000	1.800
									44.800

Üniversitemizin spor hizmet alanları; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Merkez Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortlarından oluşan toplam on iki adet açık spor alanı bulunmaktadır. Açık spor alanları toplamı 9950 m²dir.

Üniversitemiz, sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Merkez Yerleşkede yer alan iki adet toplantı (50 kişilik) ve bir adet amfi (480 kişilik) dışında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı salonu (50 kişilik) bulunmaktadır.

Üniversitemizin mevcut taşıtlar listesi 4 adet binek otomobil, 1 adet station-vagon, 1 adet minibüs, 1 adet otobüs ve 1 adet pikap olmak üzere 8 araçtan oluşmaktadır.

Üniversitemizde örgün öğretim ve ikinci öğretim eğitimin yanında yaz okulu eğitimi de verilmektedir. Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizde lisansüstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizin tüm programlarında eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Üniversitemizin mevcut öğrenci sayıları birinci öğretim 2860 ön lisans, 1107 lisans, 107 yüksek lisans olmak üzere toplam 4074, ikinci öğretim 1646 önlisans, 962 lisans, 80 yüksek lisans olmak üzere toplam olmak üzere toplam 2688 olup, toplam 6762 öğrencidir. Üniversitemizin bölüm kontenjanları dikkatte alınarak çok yıllık bütçe dönemlerinde ulaşılacağı tahmini öğrenci sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6 Öğrenci Sayıları

YILLAR	2010–2011	2011–2012	2012–2013
Öğrenci Sayıları	4447	5705	6762

Üniversitemizde 2012 yılı sonu itibariyle Akademik ve İdari Kadrolarının dağılımını gösterir tablo ise aşağıya çıkartılmıştır.

Tablo 7 Akademik ve İdari Personel Sayıları (2012 yılı sonu itibariyle)

YIL	MEMUR KADROSU (A)	AKADEMİK KADROSU (B)	KADROLU PERSONEL (A+B)	SÜREKLİ İŞÇİ
2012	245	243	488	7
YIL	AÇIKLAMA	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
2012	PROFESÖR	9	36	45
	DOÇENT	9	81	90
	YRD. DOÇENT	54	56	110
	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	72	113	185
	OKUTMAN	13	43	56
	ÇEVİRİCİ	-	1	1
	EĞİTİM VE ÖĞRT. PLAN.	-	1	1
	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	87	44	131
	UZMAN	4	16	20
	TOPLAM	248	391	639

1.8. 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Üniversitemizin 2012 yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor, DKH-Sosyal sektörü olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.2012 yılı bütçesinde Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin % 88'i kullanılmıştır.

2012 Yılı Yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; Kütüphane Mimari Uygulama Projeleri ve ihale Dokümanları, İktisadi ve İdari Bilimler Binası Mimari Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları ve yapılacak olan inşaat ihaleleri için belgelerin hazırlanması işleri yapılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde, 2012 yılı içinde Merkez Kampusun muhtelif çevre düzenleme işi, taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, su hattı, elektrik hattı ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi ve yapılması için kullanılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2012 yılı içinde bu ödenekten 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlatılan Kafeterya İnşaatı tamamlanmıştır. 2011 yılı başında temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı ile 2012 yılı sonunda başlayan Kütüphane İnşaatı devam etmektedir.

Üniversitemizin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisler işinde arazi sıkıntısı sebebi ile bir yapılanma olmamıştır. 2012 Yılı ödeneği Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma tertibine aktarılmıştır.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlatılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı tamamlanmıştır.

Gayrimenkul Büyük Onarım Projesi işinde; 2012 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, idare binalarının, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır.

Yapılan işler arasında; binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana işleri, çeşitli Elektrik malzemesi alımı işi ve devam eden inşaatlar için malzeme alımı bulunmaktadır.

Merkez Yerleşke de 24.000 m² alanın ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.

Düziçi MYO'da 430 m² Yemekhane Binası İnşaatı yapılmıştır.

Bahçe MYO' da Kazan Dairesi ve Kalorifer İşleri Yapılmıştır.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işimizde; 1500 Kişilik Tribün ve Futbol Sahası ile 2 Adet Tenis Kortu, 1 Adet Çalışma Tenis Kortu, 1 Adet Basketbol-Voleybol Sahası, 1 Adet Mini Futbol Sahadan oluşan Spor Alanları Projeleri işi 2011 yılı sonunda başlanmış ve devam etmektedir.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Makine Teçhizat Alımı Projesi İşinde; idare binalarına donanım alımı, Merkez Kafeteryaya Mobilya, Yeni açılan Eğitim binasındaki (D Blok) öğrenci laboratuvarları tezgâhları, Enformatik sınıflarına masa, sandalye ve bilgisayar alımları yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerine 4500 metre fiber optik hatları çekilmiş, harcama birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımlar temin edilmiştir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Alımı Projesi İşinde; 2012 eğitim-öğretim döneminde kütüphane kitap sayısı, abone olunan veri tabanı sayısı ile Öğrenci başına düşen kitap sayısının artırılarak, (Toplam Kitap Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı) Kütüphane kullanıcı memnuniyet oranı yükseltilmiştir.

Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina ve arsa sorunlarının çözülmesi için girişimlerde bulunulmuş ve Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenekten OKÜ Karacaoğlan Yerleşkesi Bitişğinde bulunan 189-190 parsel numaralı 46.600 m² yüzölçümlü taşınmazların kamulaştırılması işlemi tamamlanmıştır.

Tablo 8 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Faaliyetler	Hedefler
Electronic Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısını 20.000'e yükseltmek
Kitap Koleksiyonu	Kitap koleksiyonu için 2500 adet kitap satın almak
E-Kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	10000 adet elektronik kitabın koleksiyona eklenmesi
Kataloglama	2500 adet kataloglama yapmak.

Tablo 9 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2012 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faaliyetler	Gerçekleşen Hedefler
Electronic Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısı 13.500 yükselmiştir. (TUBİTAK-EKUAL)
Kitap Koleksiyonu	5204 adet kitap satın alınmış, koleksiyona eklenmiştir.
E-Kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	86000 adet elektronik kitap koleksiyona eklenmiştir.
Kataloglama	5204 adet kitap kataloglanmıştır.

1.9. 2012 Yılı Yatırım Uygulamaları

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına uygun bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir.

Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmiştir.

Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.

Verilen ödeneklerle, 2012 yılı içinde tamamlanamayan ilgili projelerin 2013 yılında bitirilmesi beklenmektedir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

1.10.Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar şunlardır.

Arazi tahsis ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması,

Çalışma alanları ve ofislerin yeterli teknik donanımına sahip olmaması,

Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler ve benzeri sorunlarla karşılaşılmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin, onaylı 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Yüksek Öğretim Alanı” olarak 8000 Dekar’lık bir bölge ayrılmış olmasına rağmen, bu bölge içerisinde halen OKÜ’ ye tahsisli (veya Tapulu) alan sadece 677 Dekar’dır. Bu mevcut alan tek parça halinde olmayıp dağınık halde bulunmaktadır. Bu dağınık yapı, Üniversite’nin planlanmasında büyük sorun teşkil etmektedir. Bu parçalı alan üzerinde şekillenme kaynakların verimsiz bir biçimde kullanılmasına yol açacaktır. Örneğin her bir parsel için ayrı güvenlik, ısıtma-soğutma, elektrik, telefon ve internet altyapısı, yemekhane, kafeterya v.b. unsurların yapılması gerekecektir.

Üniversitemizin, alanın genişletilebilmesi için 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda Yüksek Öğretim Alanı olarak planlanan alanın sınırları içerisinde ve merkez Karacaoğlan Yerleşkesi’ ne bitişik arazilerin kazanılması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede ilk olarak 2810 dekarlık bir bölgenin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Üniversite tarafından hazırlanmış olup, tahsis ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Üniversitemize ait araziler dikkate alındığında; inşa edilmesi öngörülen sosyal tesisler, lojmanlar, rektörlük konutu vb. sosyal birimlerin mevcut arazi üzerine yerleştirilmesi mümkün olmayıp, yeni kazanılması planlanan bölgede yer alması düşünülmektedir. Bu nedenle kamulaştırma işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmekte ve bunun için Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca 2011, 2012 ve 2013 yıllarında olduğu gibi, önümüzdeki yıllar yatırım programlarında kamulaştırmaya pay ayrılmasına dikkat edilmelidir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversite’nin, mevcut dört fakültenin yanı sıra mevcut meslek yüksekokullarında birçok yeni programa öğrenci alması, idari ve akademik personel sayısının hızla artması ile birlikte yemekhane, kütüphane, spor salonu, derslik, laboratuvar, atölye, büro vb. sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına olan ihtiyaç katlanarak artmaktadır. Yatırım Programlarında Üniversitemiz tarafından sunulacak olan Bütçe Teklifi’nin bu çerçevede değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

2. 2012 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1. Devam Eden Kamu Yatırım Projeleri

2.1.1. 2009H032130 Kampus Altyapısı

Projenin 2012 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde, 2012 yılı içinde Merkez Kampusun muhtelif çevre düzenleme işi, taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, su hattı, elektrik hattı ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi ve yapılması için kullanılmıştır.

2012 yılı ödeneği 1.000.000 TL olup, bu miktarın 213.468 TL'si harcanmıştır. Bu ödenekten 453.748" Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ödeneğine aktarma yapılmıştır. Üniversitemizin Osmaniye yerleşkesindeki altyapı yapılandırma çalışmaları 2013 içerisinde de devam edecektir.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 25

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 50

Tablo 10 Yerleşke Altyapısı Projesi

BinTL

Proje No	2009H032130		
Projenin Adı	Yerleşke Altyapısı		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Proje Tutarı	10.000		
2012 Yılı Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.000.		
Harcama	214		
Aktarma	454		
Kalan Ödenek	332		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	25		
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	50		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
OKÜ Kampus İçi Muhtelif Çevre Düzenlemesi İşİ	8	214	
TOPLAM	8	214	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde 2012 Yılında Kampus içi muhtelif çevre düzenlemeleri, taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, su hattı, elektrik hattı, aydınlatma ve yol işleri yaptırılmıştır.			

2.1.2.2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

Projenin 2012 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2012 yılı içinde bu ödenekten 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlatılan Kafeterya İnşaatı tamamlanmıştır. 2011 yılı başında temeli atılarak başlatılan Mühendislik Fakültesi İnşaatı ile 2012 yılı sonunda başlayan Kütüphane İnşaatı devam etmektedir.

2012 Yılı ödeneği 11.000.000 TL olup, bu miktarın 9.703.251 TL'si harcanmıştır. (Bu Ödenekten 120.000 TL Muhtelif İşler Ödeneğine Aktarma Yapılmıştır.)

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 89

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 11 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Bin TL

Proje No	2009H032140		
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Proje Tutarı	40.000		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	11.000		
Kurum İçi Ödenek Aktarma	120		
Harcama	9.704		
Kalan Ödenek	1.176		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	89		
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
OKÜ Kafeterya Binası Yapımı İş	4	1.462	
OKÜ Mühendislik Fakültesi Binası İnşaatı İş	4	6.159	
OKÜ Kütüphane Binası Yapımı İş	1	1.178	
Diğer	1	903	
TOPLAM	10	9.704	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Mühendislik Fakültesi ve Kütüphane Binası İnşaatı işi devam etmektedir. 2010 yılı sonunda başlanan Kafeterya Binası İş 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır.			

2.1.3.2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesisler

Projenin 2012 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi

Üniversitemizin ihtiyaçlarından olan Lojman ve Sosyal Tesisler işinde arazi sıkıntısı sebebi ile bir yapılanma olmamıştır.

2012 Yılı ödeneği 1.500.000 TL olup ve bu miktarın tamamı Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri tertibine aktarılmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 0

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 0

Tablo 12Lojman ve Sosyal Tesisler Projesi**Bin TL**

Proje No	2009H032150		
Projenin Adı	Lojman ve Sosyal Tesis Projesi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Proje Tutarı	5.000		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.500		
Harcama	-		
Kurum İçi Aktarma	1.500		
Gerçekleşme Oranı %	-		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	-	-	
Diğer Açıklamalar: 2012Yılı Lojman ve Sosyal Tesis Projemizdeki ödenek, Kamulaştırma ödeneğine aktarılmıştır.			

2.1.4 Kamulaştırma Giderleri

Projenin 2012 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi

Üniversitemizin acil ihtiyaçlarından olan arazi sıkıntısının aşılması için Gayrimenkul Alımı ve Kamulaştırma 2012 yılı ödeneği ile 46.600 m² arazi alınarak harcaması yapılmıştır.

2012 Yılı ödeneği 1.300.000 TL olup, Lojman ve Sosyal Tesisler Projesinden 1.500.000 TL Kamulaştırma için aktarılmış ve toplam ödeneği 2.800.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 2.796.000 TL'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 13 Kamulaştırma Giderleri

Bin TL

Projenin Adı	Kamulaştırma Giderleri
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.300
Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen	1.500
Toplam Ödenek	2.800
Harcama	2.800
Kalan Ödenek	4.000
Gerçekleşme Oranı %	100

İşin Adı	Kamulaştırma Adedi	Tutarı
189 Parsel Numaralı 20.600 m²) Taşınmazın Kamulaştırılması	1	1.240
190 Parsel Numaralı (26.000 m²) Taşınmazın Kamulaştırılması	1	1.560
Toplam Harcama	2	2.800

Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin acil ihtiyaçlarından olan arazi sıkıntısının aşılması için Gayrimenkul Alımı ve Kamulaştırma 2012 yılı ödeneğinden 46.600 m² arazi alınarak harcaması yapılmıştır. Üniversitemiz kamulaştırma çalışmalarına devam etmektedir.

2.1.5 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu

Projenin 2012 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işimizde; 1500 Kişilik Tribün ve Futbol Sahası ile 2 Adet Tenis Kortu, 1 Adet Çalışma Tenis Kortu, 1 Adet Basketbol-Voleybol Sahası, 1 Adet Mini Futbol Sahadan oluşan Spor Alanları Projeleri işi 2011 yılı sonunda başlandı ve 2012 yılı sonu itibariyle halen devam etmektedir.

2012 Yılı ödeneği 3.961.748 TL olup, bu miktarın 3.049.748 TL'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 77

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 14 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Bin TL

Proje No	2008H050160		
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Proje Tutarı	5.000		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.898		
Kurum İçi Ödenek Ekleme	1.064		
Kullanılabilir Ödenek	3.962		
Harcama	3.050		
Kalan Ödenek	912		
Gerçekleşme Oranı %	100		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
Açık Spor Alanları İnşaatı İş	7	3.050	
TOPLAM HARCAMA	7	3.050	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Spor Tesisleri işimizde, 2011 yılı sonunda başlayan: Tribünlü Futbol Sahası, 1 Adet Basket ve Voleybol Sahası, 2 Adet Tenis Kortu, 1 Adet Çalışma Tenis Kortu ve Mini Futbol Sahası İnşaatı İş dev			

2.1.6 2010K121290DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Projenin 2012 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuvarı işimizde, 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlatılan Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı tamamlanmıştır.

2012 Yılı ödeneği 105.000 TL olup, bu miktara Emanet Hesabındaki 489.000 TL eklenerek oluşan 594.000 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 100

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 15DKH Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Bin TL

Proje No	2010K121290		
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaat İşi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Proje Tutarı	4.527		
Kullanılabilir 2012 yılı Ödenek Gönderme	105		
Kurum İçi Emanet Hesabındaki Ödenekten Ödeme	489		
Kullanılabilir Ödenek	594		
Harcama	594		
Kalan Ödenek	-		
Gerçekleşme Oranı %	100		
İşin Adı	Ödeme Belge Adedi	Tutarı	
Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı Yapım İşi.	1	594	
TOPLAM HARCAMA	1	594	
Diğer Açıklamalar: OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında, Merkezi Araştırma Laboratuvarının 2010 yılı sonunda yapımına başlanmış,2012 yılı itibariyle 2522 m² kapalı alan inşaatı tamamlanmış olup, 2013 yılı için Makine Teçhizat alımları devam etmektedir.			

2.1.7. 2011H036050 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin 2012 Uygulamaları, Harcamaları, Nakdi ve Fiziki Gerçekleşme Seviyesi

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri işimizde, Kütüphane Mimari Uygulama Projeleri ve ihale Dokümanları, İktisadi ve İdari Bilimler Binası Mimari Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanları ve yapılacak olan inşaat ihaleleri için belgelerin hazırlanması işleri yapılmıştır.

2012 yılı ödeneği 200.000 TL olup, bu miktarın 133.930 TL'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 67

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 16 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Bin TL

Proje No	2012H032690		
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200		
Harcama	134		
Kalan Ödenek	66		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	67		
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100		
İşin Adı	Adedi	Tutarı	
OKÜ Dök. Haz. İş	3	134	
TOPLAM HARCAMA	3	134	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde; Kütüphane Binası Projeleri hazırlanması ve İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Binası Projeleri hazırlanması işi yaptırılmıştır. Eski lojman binasının statik analizi Yaptırılmıştır.			

2.1.8. 2012H032700 Muhtelif İşler Projesi

Projenin 2012 uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapılmıştır. İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçları temin edilmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz birimlerine yazılım alımı ile 4500metre Fiber Optik hat çekimi yapılarak, sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Kütüphane'nin öğrencilere daha iyi hizmet verebilmesi için Fen Bilimleri ve Sosyal bilimler alanında 5204 Adet (Türkçe+Yabancı dil) kitap alımı ve 1 Adet Veri Tabanı Aboneliği gerçekleştirilmiştir.

2012 Yılı ödeneği 2.590.000 TL olup, bu miktarın 2.497.802 TL'si harcanmıştır.

Nakdi Gerçekleşme Oranı : % 99

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

Tablo 17 Muhtelif İşler Projesi(Kurum Geneli)

Bin TL

Proje No	2012H032700	
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	2.000	
Üniversite Likit Ekleme	470	
Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen	219	
Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen	99	
Kullanılabilir Ödenek	2.590	
Harcama	2.498	
Kalan Ödenek	92	
Nakdi Gerçekleşme%	98	
Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	47	1.012
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı		869
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		198
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1	420
TOPLAM HARCAMA		2.498
Diğer Açıklamalar: Muhtelif İşler Kapsamında ki harcamaların detayları daireler itibariyle tablolarda gösterilmiştir		

Tablo 18 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Bin TL

Proje No	2012H032700		
Projenin Adı	Muhtelif İşler Projesi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
2012 Yılı Proje Ödeneği	600		
Üniversite Likit Ekleme	380		
Kurum İçi Ödenek Ekleme	120		
Kullanılabilir Ödenek Toplamı	1.100		
Harcama	1.012		
Kalan Ödenek	88		
Nakdi Gerçekleşme%	92		
Fiziki Gerçekleşme%	100		
İşin Adı	Harcama Belge Adedi	Tutarı	
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	43	553	
OKÜ Düziçi MYO Yemekhane İnşaatı İşi.	3	459	
OKÜ Bahçe MYO Kazan Dairesi ve Kalorifer İşi.	1	133	
TOPLAM HARCAMA	47	1.012	
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde,2012 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödenegin harcaması yapıldı. Çeşitli mal alımı, idari binanın, laboratuvarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Düziçi MYO Yemekhane İnşaatı yapıldı. Bahçe MYO Kazan Dairesi ve Kalorifer İşleri yapıldı. Yerleşke içindeki bazı binaların çatı onarımları ve izolasyonları ile dış cephe kaplamaları, bina içi boya-badana vb. işleri yapılmıştır.			

Tablo 19 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Bin TL

Proje No	2012H032700	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	900	
Harcama	900	
Kalan Ödenek	-	
Gerçekleşme Oranı %	100	
İşin Adı	Belge Adedi	Tutarı
Büro Mobilyası Alımı	845	260
Fotokopi Makinesi	4	19
Masaüstü Bilgisayar	159	285
Dizüstü Bilgisayar	15	33
Jeneratör Alımı	1	43
Klima Alımı	10	19
Güvenlik Sistemi Alımı	1	9
Uzaktan Eğitim Sistemi Kurulumu	1	31
Laboratuvar Cihazı Alımı	7	17
Yazıcı Alımı	7	10
Projeksiyon Cihazı	5	10
Traktör Alımı	1	38
Elektrikli Bisiklet	5	9
Kepçe (Kazıcı, Yükleyici)	1	118
TOPLAM HARCAMA		900
Diğer Açıklamalar: Yukarıda belirtilen satın almalarla Üniversitemiz Rektörlük Birimleri ile Akademik birimlerinin ihtiyacı olan büro mobilyası, makine teçhizat, laboratuvar malzemesi gibi çeşitli ihtiyaçları karşılanmıştır.		

Tablo 20 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Bin TL

Proje No	2012H032700	
Projenin Adı	Muhtelif İşler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	300	
Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen	99	
Kurum İçi Aktarmalarla Eklenen	99	
Likit Ödenek eklenen	90	
Toplam Ödenek	390	
Toplam Harcama	390	
Gerçekleşme Oranı %	%100	
İşin Adı	Belge Adedi	Tutarı
06.1. MAMUL MAL ALIMLARI	16	289
06.3. GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6	101
TOPLAM HARCAMA		390
Diğer Açıklamalar: 2012 yılında Bilgisayar ve makine teçhizat ve Edu ram Projesinde kullanılmak üzere cihaz alımı ile çeşitli yazılım alımları gerçekleştirilmiştir.		

Tablo 21 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Bin TL

Proje No	2012H032730		
Projenin Adı	Muhtelif İşler / Basılı Yayın alımları ve yapımları		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	200		
Harcama	198		
Kalan Ödenek	2		
Gerçekleşme Oranı %	98.7		
İşin Adı	Belge Adedi	Tutarı (TL)	
Basılı Yayın Alımları ve Yapımları	12	198	
TOPLAM HARCAMA	12	198	
Diğer Açıklamalar: Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe+Yabancı dil) alanında 5204 adet kitap alımı yapılmıştır.			

2.2. Tamamlanan Kamu Yatırım Projeleri

2.2.1 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kafeterya İnşaatı

Tablo 22 Derslik ve Merkezi Birimler Merkezi Kafeterya İnşaatı

Bin TL

Proje No	2009H032140		
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Sözleşme Bedeli	5.022		
Ek Sözleşme Bedeli	506		
Toplam Sözleşme Bedeli	5.524		
Fiyat Farkı Ödemeleri	532		
KDV Dahil Toplam Hak ediş Bedeli	6.056 +KDV 1.090=7.146		
Kapalı Alan	8090 m²		
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	100		
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	100		
İşin Adı: Merkezi Kafeterya İnşaatı			Tutarı
OKÜ Kafeterya Binası Yapımı İş'i 2012 yılında tamamlanmış olup, aynı anda 1500 kişiye hizmet verecek nitelikte, teknik açıdan modern ekipmanlarla donatılmış, hijyenik koşullara uygun hizmet tesisi yapımı sağlanmıştır.			

3.ÖNERİLER

İdari ve teknik insan kaynaklarının bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sağlanması yararlı olacaktır.

Yerleşke alanı yetersiz olan Üniversitelere kamulaştırma ödeneğini kullanım izni verilmelidir.

Çok yıllık projelerin yıllık ödeneğinin talep edilenden düşük olarak tahsis edilmesi yatırımların tamamlama sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir.

Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir.

2014 Yılı Yatırım Programı hazırlanırken, mutlaka kamulaştırmaya ayrılan payların artırılması ve yeni açılacak idari ve akademik birimlerinin yatırım ihtiyacının karşılanması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi için büyük önem arz etmektedir.

Tablo 23 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2012 Yılı Kamu Yatırımları Özeti

Bütçe Türü: Özel Bütçe

Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2011 Sonu Kümülatif Harcama			2012 Yılı Program Ödenek			2012 Yılı Revize Ödenek			2012 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		77.697	29.807		29.807	19.898	470	20.368				17.564	622	18.186
Sağlık															
D.Kamu Hiz.	1		4.527	3.462		3.462	105	489	594				105	489	594
TOPLAM	6		82.224	33.269		33.269	20.003	959	20.962				17.669	1.111	18.780

Tablo 24 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2012 Yılı Yatırım Projeleri Listesi

KURULUŞ ADI: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
SEKTÖR ADI: EĞİTİM YÜKSEK ÖĞRETİM

EK - 4

2012Kümülatif Nakdi Bin TL

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2011 YILI SONU KÜMÜLÂTİF HARCAMA (10)	2012 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
5.822	431	2012H032690	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2012	Osmaniye		200	0			200					134
5.823	431	2012H032700	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2012	Osmaniye		2.037	2.037		470	2.000	,	120			2498
5.824			Kamulaştırma	Özel Bütçe	2012	Osmaniye			900			1.000		1.500			2.800
5.825	431	2009H032130	Kampus Altyapısı	Özel Bütçe	2009-2014	Osmaniye		10.700	1900			1.000	-454				54
5.826	431	2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2009-2014	Osmaniye		52.910	22500			11.000	-120				9.704
5.827	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2009-2012	Osmaniye		5.350	0			1.500	-1500				0
TOPLAM								71.197	27.337		470	17.000	2.074	1620			15.136

SEKTÖR ADI: YÜKSEK ÖĞRETİM SPOR

2012 Kümülatif Nakdi

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2011 YILSONU KÜMÜLÂTİF HARCAMA (10)	2012 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
5.258	431	2009H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2008-2012	Osmaniye		6.500	2.472		610	2.898	+	454			3.050
																	0
TOPLAM								6.500	2.470		610	2.898		454			3.050

SEKTÖR ADI: DKH						TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA		2012 Kümülatif Nakdi									
BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2011 YILSONU KÜMÜLATİF HARCAMA (10)	2012 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
							DIŞ (8)	TOPLAM (9)		DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+, - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)											
5.258	431	2010K121290	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2010-2012	Osmaniye		4.527	3.462		489	105					594
																	0
TOPLAM								4.527	3.462		489	105					594
		GENEL TOPLAM						82.524	33267		1.569	20.003	2.074	2.074			18.780
