TC

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Raporun Düzenlenme Amacı:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçları, ilgili kamu idaresi tarafından izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar bir rapor halinde Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir. " hükmü gereği.

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÖNETİCİ SUNUMU 7

1. *GENEL DEĞERLENDİRME* 9
   a- Kuruluşun Misyonu 9
   b- Kuruluşun Vizyonu 9
   c- Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri 9
2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI 10
3. ÜNİVERSİTEMİZİN YAT. FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI 10
4. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ 12
5. 2010 YILI YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 14
6. 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI 15
   6.1- Genel Yatırım Uygulama Durumu 15
   6.2- Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 16
7. 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI 16
   7.1- Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 2010H031600 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 16
8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009H032130 Kampus Altyapısı 17
9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler 17
10. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 18
11. 2010H031610 Muhtelif İşler Projesi 18
12. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu 21
13. ÖNERİLER 23

EK: 3- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2010 yılı yatırım özeti 25

EK: 4- 2010 yılı yatırım projeleri listesi (Bin TL) 27

T A B L O L A R

Tablo 1- Üniversitemiz 2010 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu 11
Tablo 2- Üniversitemiz 2010 Yılı Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri
Ekonomik Kod Dağ. ve Oranları 11
Tablo 3- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (Yılsonu İtibariyle, 2010).....13
Tablo 4- Akademik ve İdari Personel Sayıları (2010 Yılı Sonu İtibariyle) 14
Tablo 5- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 16
Tablo 6- Kampüs Alt Yapısı 17
Tablo 7- Derslik ve Merkezi Birimler 17
Tablo 8- Lojman ve Sosyal Tesis Projesi 18
Tablo 9- Muhtelif İşler Projesi 18
Tablo 9/a- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi 19
Tablo 9/b- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....19
Tablo 9/c- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi 20
Tablo 9/d-Kütüphane ve Dökumantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi.....20
Tablo 10- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi.....21
Tablo 11- DKH Merkezi Araştırma Laboratuarı Projesi 21
Tablo 12- Kamulaştırma Giderleri 21
Tablo 13- Küt. ve Dok. Dai. Bşk. 2010 Yılı Yat. Hedeflenen ve Gerçekleşen Kap. Artışı 22
Tablo 14- Küt. ve Dok. Dai. Bşk. 2010 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 22

Ş E K İ L L E R

Şekil 1- Harcama Oranları 11
Şekil 2- Öğrenci Sayıları 13

YÖNETİCİ SUNUMU

Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin çeşitli raporlar hazırlamalarını zorunlu kılmış, bu raporlar sayesinde, idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğinin kontrol edilebilmesi amaçlanmış bulunmaktadır.

Günümüzde, toplumların gelişmişlik düzeyini, yaşam standartlarını ve uluslararası rekabet güçlerini etkileyen unsurların başında bilgi üretme gücü gelmektedir. Üniversiteler, yürüttükleri bilimsel araştırmalarla doğrudan bilgi üretmenin yanısıra, bilgi üretebilecek ve bu bilgiyi toplumun yararına sunabilecek niteliklerde eleman yetiştiren kuruluşlardır. Şüphesiz bu kuruluşların ülkelerin kalkınmasında ve çağdaşlaşmasında önemli sorumlulukları vardır.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, yakın geçmişte faaliyete geçen üniversitemiz, sınırlı ekonomik, fiziksel ve insan kaynakları ile, ülkemizin ekonomik, sosyal, fiziksel ve teknolojik gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamakta, bunları sağlamak için gelişen mimari ve teknolojiye uygun hizmet binaları inşa ederek, teknolojik açıdan donanımlı sınıflar, laboratuarlar oluşturarak eğitim ve öğretimi sürdürmenin yanı sıra diğer akademik faaliyetlerde bulunmayı, böylelikle bölgemize yeni bir açılım getirmeyi hedeflemektedir.

Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı plan ve programlarına uygun olarak bitirilmesi hedeflenmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25. Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. Maddesi uyarınca Üniversitemizin 2010 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

2010 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarla ilgili faaliyetleri yürüten tüm personelimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

a) Kuruluşun Misyonu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin misyonu; bölgesel alanda etkili, ulusal alanda tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin ve işbirliğine açık bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; ülkemizin ve bölgemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü olmak; mezunlarımızın ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, kamu ve özel sektörde aranan ve kabul gören bireyler olmasını sağlamak; katılımcılığa ve takım çalışmasına dayalı kurum kültürü oluşturarak bilgi yaratma ve yayma konularında öncülük etmektir.

b) Kuruluşun Vizyonu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin vizyonu; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimsel yayın ve uygulamada gelişmiş ülke standartlarına ulaşmak; çağın gerektirdiği mesleki, teknik ve bilgi donanımına sahip bireyler yetiştirmektir.

c) Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

1- Toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla; düşünme, algılama ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, milli ve manevi değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren, beceri düzeyi yüksek, üretken ve yaratıcı, bilgi çağı insanı yetiştirmek,
2- Ülkemizin yeni kurulan yükseköğretim kurumlarından birisi olarak, yerel parametreler, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerle birlikte dikkate alınarak teknik ağırlıklı bir üniversite olmak,
3- Eğitimi, insan kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile işbirliği kurarak, değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejileri geliştirmek,
4- Eğitime ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması, eğitimde etkinliğinin artırılması, erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapıyı güçlendirmek,
5- Kaliteli eğitim verilmesi için, Üniversitenin fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirerek toplam kalite ve iyi yönetişim anlayışını üniversitede hâkim kılmak için performans ölçümüne dayalı bir model geliştirmek,
6- Ulusal kaynakların en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi, iller ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının en aza indirilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sektörsel politikalara mekânsal boyut kazandırılabilmesi amacıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanında yeni Fakülteler kurmak.

2. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

a) Özel Bütçe
b) Hazine Yardımı
c) Öz Gelirler
   1) Kira Gelirleri
   2) SKS Gelirleri
   3) Yaz Okulu Gelirleri
   4) İkinci Öğretim Gelirleri
d) Döner Sermaye
e) Bütçe Dışı Kaynak
   1) TÜBİTAK
   2) SAN-TEZ
   3) AB
   4) Şartlı Bağış ve Yardımlardan Oluşmaktadır.

3. ÜNİVERSİTEMİZİN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

Anayasa'nın 130.maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde "...Yükseköğretim paralıdır." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler de dikkate alınarak Üniversitemiz yatırımlarının finansmanı aşağıda belirtilen kaynaklardan sağlanmaktadır:

a) 2547 sayılı yasanın 55.maddesi uyarınca her yıl bütçeye konulacak ödenekler,
b) 2547 sayılı yasanın 46.maddesi uyarınca cari hizmet maliyetine katkı olarak alınan öğrenci katkısı gelirleri,
c) Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması hakkındaki 27.11.1992 tarih ve 3843 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri,
d) 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesi uyarınca döner sermayeden elde edilen gayrisafi hâsılatın % 10'undan az olmamak üzere elde edilen gelirler,
e) 2547 sayılı yasanın Ek 25. maddesi uyarınca kurumumuz adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirler
f) 2547 sayılı yasanın Ek 26.maddesi uyarınca yürütülen yaz okulu öğretim ücreti gelirleri,
g) 2547 sayılı yasanın EK-27 maddesi uyarınca yürütülen Tessiz Yüksek Lisans ücreti gelirlerinden oluşmaktadır.

Tablo 1) Üniversitemiz 2010 Yılı Ödenek Harcama ve Gelir Farkları Tablosu (TL)

2009 Mali Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Alınan Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama	İptal Ödenek	Yıl Sonu Bloke Toplam	Ertesi Yıla Devredilen Öz Gelir Farkı
28.766.000	12.854.911,20	41.620.911,20	31.902.849,05	9.718.062,15	---	1.189.307,10

Tablo 2) Üniversitemiz 2010 Yılı Sermaye Giderleri ve Sermaye Transferleri Ekonomik Kod Dağılımları ve Oranları (TL)

EKO. KOD	AÇIKLAMA	ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	HARCAMA ORANI % (harcama/serbest)
06.1	Mamul Mal Alımları	1.329.000	1.329.000	1.306.289	98
06.2	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projeleri	300.000	300000	132.160	44
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	149.000	149.000	30.693	25
06.4	Kamulaştırma Giderleri	2.000	2.000	0	0
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.550.000	18.550.000	15.012.165	81
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	400.000	400.000	396.531	99
	GENEL TOPLAM	20.730.000	20.730.000	16.877.838	82

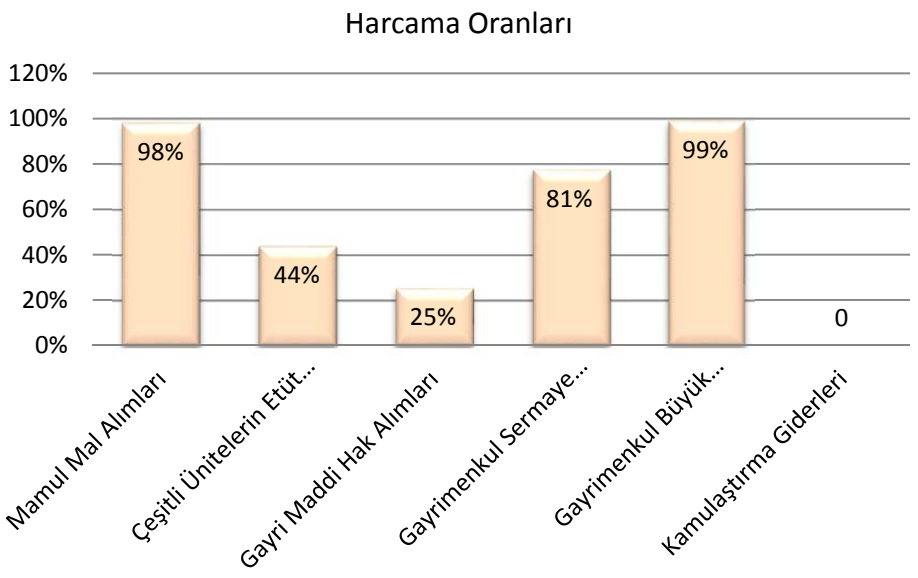

Şekil 1) Harcama Oranları

4. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 722738,46 m^2'si maliye hazinesi olmak üzere, toplam 806138,46 m^2 taşınmaz alana sahiptir. Üniversitemizin 2009 yılında 32364 m^2 olan kapalı alan toplamı 2010 yılında Osmaniye Merkez Yerleşkemiz 45400 m^2, Bahçe Meslek Yüksek Okulu 4460 m^2, Kadirli Meslek Yüksek Okulu 5600 m^2, Erzin Meslek Yüksek Okulu 1120 m^2, Düziçi Meslek Yüksek Okulunun 3320 m^2 kapalı hizmet alanı ile birlikte kapalı alan toplamımız 59900 m^2'ye ulaşmıştır.

Osmaniye Karacaoğlan merkez yerleşkedeki 21000 m^2 Fakülteler Derslik Binası ve 3500 m^2 Kapalı Spor Salonu inşaatı 2010 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Yeni Rektörlük Hizmet Binası 6500 m^2 alana sahip olup 2011 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Yeni Binalarımızın hizmete girmesiyle kapalı alan toplamımızın 66400 m^2'ye ulaşması beklenmektedir.

Üniversitemizin açık spor hizmet alanları; Kadirli, Bahçe ve Düziçi Meslek Yüksekokulları ile Merkez Yerleşkesinde, futbol, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortlarından oluşan toplam on iki adet açık spor alanı olup, 7837 m^2 dir.

Üniversitemiz, sosyal alanları içerisinde yer alan toplantı ve konferans salonları ele alındığında, Merkez Yerleşkede yer alan iki adet toplantı (50 kişilik) ve bir adet amfi (480 kişilik) dışında, Kadirli ve Düziçi Meslek Yüksekokullarında da birer adet toplantı salonu (50 kişilik) mevcut bulunmaktadır.

Üniversitemizin mevcut taşıtlar listesi 2 adet binek otomobil, 1 adet Station-vagon, 1 adet 15 kişilik minibüs, 1 adet kamyonet, 1 adet 37 kişilik otobüs olmak üzere toplam 6 adet araçtan oluşmaktadır.

Üniversitemiz değişik büyüklüklerde toplam 19 binada 59900 m^2 kapalı alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerinin sosyal ve sportif etkinlikleri için futbol, basketbol, voleybol sahaları ile masa tenisi, bilardo masası ve masa topu imkânları bulunmaktadır.

Üniversitemiz kurulduğu 2007 yılından bu yana akademik birimleri ile kaliteli eğitim-öğretim sunma çabası içerisindedir. Üniversitenin birimleri, Osmaniye Karacaoğlan Yerleşkesi'nde bulunan merkez yerleşkesi ile Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin ilçelerinde yer almaktadır. Merkezde Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Osmaniye Meslek Yüksek Okulu, ilçelerde ise Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin Meslek Yüksekokulları yer almaktadır.

Üniversitemizde örgün öğretim ve ikinci öğretim eğitiminin yanında yaz okulu eğitimi de verilmektedir. Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizde de lisans üstü eğitim verilmektedir. Üniversitemizin tüm programlarında eğitim-öğretim dili Türkçedir. Üniversitemizin 2009-2010 yılı sonunda, öğrenci sayıları birinci eğitim 2668, ikinci eğitim 1776 olup, Yüksek Lisans 3 olmak üzere toplam 4447 öğrencidir.

2010 Yılsonu itibariyle Üniversitemizde Yüksek Lisans Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin toplamı 4447'dir. Öğrencilerin birimler düzeyinde dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Sayıları (Yılsonu İtibariyle, 2010)

BİRİMLER	I.ÖĞRETIM			II. ÖĞRETİM			TOPLAM		TOPLAM
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Kız	Erkek	
Osmaniye MYO	874	278	1152	807	209	1016	487	1681	2168
Kadirli MYO	247	122	369	66	67	133	189	313	502
Bahçe MYO	206	239	445	128	99	227	338	334	672
Düziçi MYO	189	122	311	86	36	122	158	275	433
Fen Bilimleri Enstit.	2	1							3
Fen-Edebiyat Fak.	78	113	191	28	45	73	158	106	264
İİBF	35	50	85	39	47	86	97	74	171
Mühendislik Fak.	71	44	115	89	30	119	74	160	234
TOPLAM	1702	969	2668	1243	533	1776	1501	2943	4447

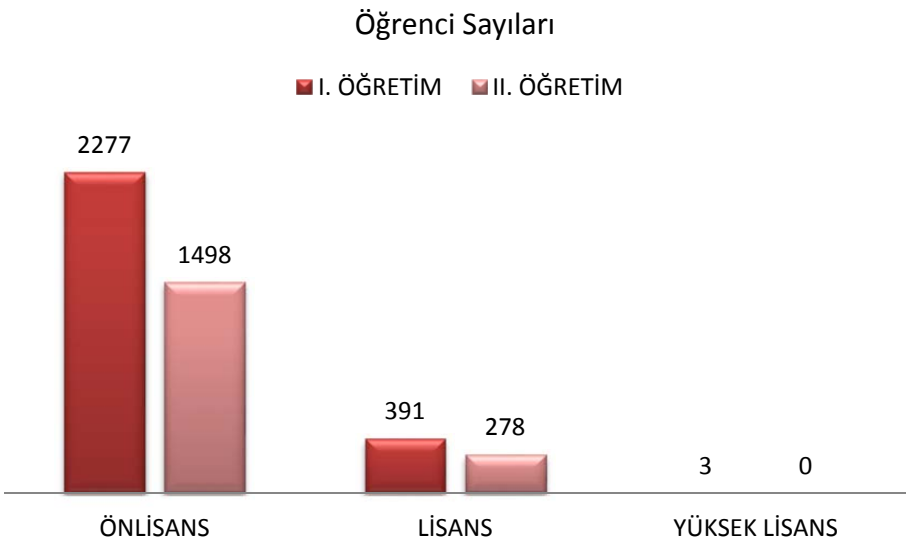

Şekil 2) Öğrenci Sayıları

Üniversitemizde 2010 yılı sonu itibariyle Akademik ve İdari Kadrolarının dağılımını gösterir tablo ise aşağıda çıkartılmıştır.

Tablo 4) Akademik ve İdari Personel Sayıları (2010 yılı sonu itibariyle)

YIL	MEMUR KADROSU (A)	AKADEMİK KADROSU (B)	KADROLU PERSONEL (A+B)	SÜREKLİ İŞÇİ
2010	190	212	402	7
YIL	AÇIKLAMA	KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE		
		DOLU	BOŞ	TOPLAM
2010	PROFESÖR	2	43	45
	DOÇENT	8	82	90
	YRD. DOÇENT	36	74	110
	ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	73	113	186
	OKUTMAN	13	43	56
	ÇEVİRİCİ	-	1	1
	EĞİTİM VE ÖĞRT. PLAN.	-	1	1
	ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	76	54	130
	UZMAN	4	16	20
	TOPLAM	212	427	639

Üniversitemizin 2010 yılı Yatırım Projelerinin Dağılımı; Eğitim-Yükseköğretim, Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor, DKH olmak üzere 3 sektör altında toplanmıştır.

5. 2010 YILI YATIRIMLARI İLE HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Üniversitemiz 2010 yılı içinde yatırım programında yer alan;

Çeşitli Ünitelerin Etüt Proje harcamaları kaynağından, Üniversitenin önemli bir ihtiyacı olan Merkezi Kafeterya Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projeleri hizmet alımı işi, Merkezi Laboratuar Mimari ve Tesisatlar Uygulama Projelerinin hizmet alımı işi ihalesi yapılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kampüs Altyapısı işimizde, 2010 yılı içinde Merkez Kampusun taşıt yolu, yaya yolu, internet hattı, su hattı, elektrik hattı ve aydınlatma gibi altyapı gereksinimlerinin yenilenmesi yapılmıştır. 500 metre uzunluğunda Galeri yapımı işi ve Merkez Kampüsün Elektrik Enerji Hattı döşenmesi işi yapılmıştır.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Derslik ve Merkezi Birimler işimizde, 2010 yılı içinde bu ödenekten yıllara sair olan Derslik Birimleri 1. Blok Eğitim Binası İnşaatı tamamlanmıştır. Kafeterya İnşaatı 2010 yılı sonunda temeli atılarak başlanmış ve devam etmektedir.

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Kamulaştırma Giderleri ödeneğinin yetersiz gelmesi nedeniyle kamulaştırma işlemi yapılamamıştır.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, İdari ve Akademik binalar için donanım alımı, Üniversite Kütüphanesine kitap alımları, Üniversitemiz birimlerine bilgisayar yazılımı alım işi yapılmıştır.

Ayrıca, idari binanın, laboratuarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Yapılan işler arasında; binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana işleri yapılmıştır. C Blok diye adlandırdığımız derslik bloğunda bulunan Kütüphane'nin öğrencilere daha iyi hizmet verebilmesi için geniş kapsamlı bakım, onarım ve tadilatı gerçekleştirilmiştir. Kadirli Meslek Yüksekokulu İdari ve Derslik binalarının tadilat, bakım, onarım ve boya-badana işleri yapılmıştır. Kadirli Melek Yüksekokulu'na 114 kişi kapasiteli bir Seminer Salonu yapılmıştır. Kampus içindeki binaların tamamında çatı onarımları ve izolasyonları yapılmıştır.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işimizde, 2009 yılında başlanan 500 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu inşaatı tamamlanmıştır.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Merkezi Araştırma Laboratuarı işimizde, 2010 yılında başlanan Merkezi Araştırma Laboratuarı inşaatı devam etmektedir.

6. 2010 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

6.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

2010 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin % 82'si kullanılmıştır. Harcanan ödenekler amacına uygun olarak kullanılmış olup 2010 yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıştır.

Üniversitemizin yapılandırılmakta olan laboratuar ve diğer araştırma alanlarının tamamlanması ile kullanılacak ödenek oranlarının önümüzdeki yıl için artması beklenmektedir. Üniversitemiz, akademik çalışmalar için OKÜMERLAB (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Merkez Laboratuarı) geçici bina çalışmasını tamamlamış, bu bina içerisinde bir adet kimya laboratuarı ile bir adet biyoloji laboratuarı kurulmuştur. Osmaniye Karacaoğlan merkez yerleşkedeki 21000 m^2 Fakülteler Derslik Binası ve 500 Seyirci Kapasiteli 3500 m^2 Kapalı Spor Salonu inşaatı 2010 yılı içerisinde tamamlanmıştır. 2010 yılı içerisinde DPT tarafından kabul edilen merkezi laboratuar projesinin hayata geçirilmiş inşaatı devam etmektedir. Laboratuarın tamamlanması akademik faaliyetleri arttıracaktır.

Verilen ödeneklerle, 2010 yılı içinde tamamlanamayan ilgili projelerin 2011 yılında bitirilmesine çaba gösterilecektir. Ayrıca devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluşların nezdinde zamanında girişimlerde bulunulacaktır.

6.2. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar şunlardır:

- Üniversitemizin yeni olması nedeniyle fiziki imkânlarının ve alt yapısının yetersizliği,
- Deneyimli ve konusunda uzman yeterli teknik kadroya sahip bulunmaması,
- Arazi tahsisi ve kamulaştırma işleminin bürokratik ve mali engeller nedeniyle gerçekleşmemesi sonucunda tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılamaması,
- Çalışma alanları ve ofislerin yeterli teknik donanıma sahip olmaması,
- Kapalı mekânlarda ve arazide kullanılacak olan hizmet araçlarının yetersiz olması,
- Yapım İşleri İhale Mevzuatının uygulanmasında, ihale sürecinin çok uzun sürmesi, çok sayıda evrak düzenlenmesi gibi nedenlerle gecikmeler olması,
- Yapım işlerinde ihale hazırlık, ihale gerçekleştirme, denetim, muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul gibi komisyonların teşkilinde yeterli sayıda deneyimli mühendis ve mimar bulunmaması.

7. 2010 YILI PROJE UYGULAMALARI

7.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2010H031600 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Projenin 2010 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 5) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje No	2010H031600	
Projenin Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	300.000,00	
Harcama	132.160,00	
Kalan Ödenek	167.840,00	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	%44	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	%100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Merkez Laboratuar Mimari, Statik, Elek, Bilg. İhale Dök. İşi	1	132.160,00
TOPLAM HARCAMA	1	132.160,00
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım programında yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi işimizde, OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuarı Mimari, Statik, Elek, Bilg. Ve Mekanik Projeleri ile İhale dokümanları hazırlanması işi yapılmıştır.		

8. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009H032130 Kampus Altyapısı

Projenin 2010 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 6) Kampus Altyapısı

Proje No	2009H032130	
Projenin Adı	Kampus Altyapısı	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	3.000.000,00	
Harcama	1.481.941,75	
Kalan Ödenek	1.518.058,25	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	49	
Fiziki Fiziki Gerçekleşme%	20	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Karacaoğlan Yerleşkesi Elektrik Enerjisi Yapımı İşi	1	1.026.857,36
OKÜ 500 Metre Galeri Yapımı İşi	1	352.994,62
OKÜ Kompanzasyon ve Paratoner Kurulumu İşi	1	55.165,00
OKÜ Amfi Etrafı Kanalizasyon Yapım İşi	1	11.770,50
OKÜ Muhtelif Yol Aydınlatma İşi	1	11.639,23
TOPLAM	5	1.481.941,75
Diğer Açıklamalar: Üniversitemiz yatırım Programında yer alan Kampus Altyapısı işimizde Kampus Elektrik Enerjisi Hattı döşenmesi işi, 500 Metre uzunluğunda Galeri Yapımı işi, Kompanzasyon-Paratoner-Muhtelif Yol Aydınlatma işi ile Amfi Kanalizasyon yapımı işi yapılmıştır.		

9. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009H032140 Derslik ve Merkezi Birimler

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 7) Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No	2009H032140	
Projenin Adı	Derslik ve Merkezi Birimler	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	10.300.000,00	
Harcama	8.992.592,25	
Kalan Ödenek	1.307.407,75	
Nakdi Gerçekleşme Oranı %	82	
Fiziki Gerçekleşme Oranı %	60	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
OKÜ Derslik Birimleri 1.Blok Eğitim Binası İnşaatı İşi	1	7.402.025,69
OKÜ Kafeterya Binası Yapımı İşi	1	1.076.862,23
OKÜ Yemekhane Mimari, Statik, Elek, Bilg. İhale Dök. Haz. İşi	1	126.260,00
Kadirli MYO Muhtelif Tadilat İşi	1	330.249,36
OKÜ Müşavirlik Hizmetleri	1	7.080,00
OKÜ Muhtelif İşler	17	50.114,98
TOPLAM	22	8.992.592,25
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin Yatırım Programında yer alan Derslik Birimleri 1. Blok İnşaatı tamamlanmıştır, Kafeterya Binası İşi başlanmış devam etmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif tadilat işleri, Müşavirlik Hizmetleri, Kadirli MYO Muhtelif Tadilat İşi yapılmıştır.		

10. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2009H032150 Lojman ve Sosyal Tesis Projesi

Projenin 2010 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 8) Lojman ve Sosyal Tesis Projesi

Proje No	*2009H032150*	
Projenin Adı	*Lojman ve Sosyal Tesis Projesi*	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.500.000,00	
Harcama	0,00	
Yıl içinde Kurum İçi Aktarmalarla Düşülen	788.000,00	
Kalan Ödenek	712.000,00	
Gerçekleşme Oranı %	0,00	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Lojman ve Sosyal Tesis Projesi	0	0,00
Diğer Açıklamalar: 2010 yılı içinde *Lojman ve Sosyal Tesis Projesi* ilgili projemizde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.		

11. 2010H031610 Muhtelif İşler Projesi

Projenin 2009 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 9) Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2010H031610	
Projenin Adı	*Muhtelif İşler Projesi:*	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Harcamayı Yapan/yaptıran Birim	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	
Harcamayı Yapan/yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Harcamayı Yapan/yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	1.198.000	
Kurum İçi Ödenek Aktarma Düşülen	90.000	
Kurum İçi Ödenek Aktarmalarla Eklenen	140.000	
Kurum İçi Likit Karşılığı eklenen Eklenen	630.000	
Kullanılabilir Ödenek	1.878.000	
Harcama	1.733.513	
Kalan Ödenek	144.487	
Nakdi Gerçekleşme%	92	
Fiziki Gerçekleşme%	92	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
TOPLAM HARCAMA		1.733.513

Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, İdari ve Akademik binalar için donanım alımı, Üniversite Kütüphanesine kitap alımları, Üniversitemiz bilgisayar yazılımı alım işi yapılmıştır.

Ayrıca, idari binanın, laboratuarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapılmıştır. Yapılan işler arasında; binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana işleri yapılmıştır. C Blok diye adlandırdığımız derslik bloğunda bulunan Kütüphane'nin öğrencilere daha iyi hizmet verebilmesi için geniş kapsamlı bakım, onarım ve tadilatı gerçekleştirilmiştir. Kadirli Meslek Yüksekokulu İdari ve Derslik binalarının tadilat, bakım, onarım ve boya-badana işleri yapılmıştır. Kadirli Melek Yüksekokulu'na 114 kişi kapasiteli bir Seminer Salonu yapılmıştır. Kampus içindeki binaların tamamında çatı onarımları ve izolasyonları yapılmıştır.

Tablo 9/a) Yapı İşleri ve Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2010H031610	
Projenin Adı	*Muhtelif İşler Projesi:*	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	250.000,00	
Kurum İçi Aktarmalarla Ödenek Ekleme	50.000,00	
Kurum İçi Likit Ödenek Ekleme	100.000,00	
Kullanılabilir Ödenek	400.000,00	
Harcama	396.530,81	
Kalan Ödenek	3.469,19	
Nakdi Gerçekleşme%	99	
Fiziki Gerçekleşme%	100	
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Büyük Onarım	13	181.736,02
Amfi Klima Santrali Havalandırma Bakım Onarım İşi	1	11.210,00
Bilgi İşlem Dairesi Sistem Odası Yükseltilmesi İşi	1	5.800,88
Kadirli MYO Muhtelif Tadilat İşi	1	172.017,20
OKÜ Saha Aydınlatma İşi	1	25.766,71
TOPLAM HARCAMA	17	396.530,81

Diğer Açıklamalar: 2010 yılı içinde; mevcut binaların bakımı, onarımı, tadilatı, yenileme ve tamiratlarını yapmak ve derslik ihtiyacını karşılamak gerekliliğinden yola çıkılarak bu ödeneğin harcaması yapıldı. Üniversitemizin yatırım programında yer alan Muhtelif İşler işimizde, idari binanın, laboratuarın ve derslik bloklarının onarımı ve bakımı yapıldı. Kampus içindeki binaların tamamında çatı onarımları ve izolasyonları yapıldı. Yapılan işler arasında; binaların çatı onarımları, dış cephe kaplamaları, çürüyen doğramaların PVC olarak yenilenmesi, bina içi boya-badana vb. işleri yapıldı.

Tablo 9/b) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2010H031610	
Projenin Adı	*Muhtelif İşler Projesi:*	
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	239.000,00	
Kurum İçi Ödenek Aktarmalarla Düşülen	90.000,00	
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0	
Kullanılabilir Ödenek	149.000,00	
Harcama	30.693,00	
Kalan Ödenek	118.306,81	
Nakdi Gerçekleşme%	20	
Fiziki Gerçekleşme%		
İşin Adı	Adedi	Tutarı
Mühendislik Fakültesi Fizik Laboratuarı Yazılım Alımı	2	3.233,20
Kütüphane Dairesi Mega Network Güvenlik Alımı	1	12.980,00
Kütüphane Otomasyon Alımı	1	12.980,00
Bilgi İşlem Dairesi Web Sayfası İçerik Yönetimi Yazılımı Alımı	1	1.499,99
TOPLAM HARCAMA	5	30.693,19

Diğer Açıklamalar: Mühendislik Fakültesi Fizik Laboratuarı Yazılım Alımı, Kütüphane Dairesi Mega Network Güvenlik Alımı, Kütüphane Otomasyon Alımı, Bilgi İşlem Dairesi Web Sayfası İçerik Yönetimi Yazılımı Alımı işi yapılmıştır.

Tablo 9/c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2010H031610
Projenin Adı	*Muhtelif İşler Projesi:*
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	609.000,00
Kurum İçi Ödenek Aktarmalarla Ödenek Ekleme	118.000,00
Kurum İçi Ödenek Ekleme, (Likit Kayıt)	502.000,00
Kullanılabilir Ödenek	1.229.000,00
Harcama	1.206.607,00
Kalan Ödenek	30.693,00
Nakdi Gerçekleşme%	98
Fiziki Gerçekleşme%	98

İşin Adı Türü ve Adedi	Tutarı
Büro Mefruşatı Alımları: Koltuk Alımı 430 Adet, Dosya Dolabı 120 Adet, Etajer 50 Adet,Sehpa 50 Adet, Memur Masası 15 Adet, Hareketli Çekmece 35 Adet	129.152,83 TL
Okul Mefruşatı Alımları: Oturumlu Amfi Sırası 2394 Adet, Öğretmen Masa ve Dolabı 24 Adet	227.246,76 TL
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları: VIP Salonunda Kullanılmak Üzere 8.85 m^2 Perde Alımı	574,34 TL
Diğer Mef. Alımları: Berjer 8 Adet, Sandalye 50 Adet, Koltuk 10 Adet, Ahşap Sehpa 8 Adet, Masa 12 Adet	16.000,80 TL
Büro Makineleri Alımları: Çok Fonksiyonlu Yazıcı 8 Adet	9.267,44 TL
Bilgisayar Alımları: Bilgisayar 135 Adet	187.108,30 TL
Laboratuar Cihazı Alımları: Laboratuar Cihazı 25 Kalem	129.889,74 TL
Laboratuar Gereçleri Alımları: Laboratuar Gereçleri 40 Kalem	143.020,72 TL
İşyeri Makine Teçhizat Alımları: Buzdolabı 8 Adet, Kamera 32 Adet, Kayıt Cihazı 2 Adet, İris Lens 32 Adet, Monitör 2 Adet, Kamera Montaj Ayağı 13 Adet, Monitör 2 Adet, Kamera Montaj Ayağı 13 Adet	44.753,05 TL
Diğer Makine Teçhizat Alımları: Switch 10 Adet, Eliptik Bilgisayar 1 Adet, Kondisyon Bisikleti 1 Adet,Koşu Bandı 2 Adet, Kamera 48 Adet, Kayıt Cihazı 4 Adet, İris Lens 33 Adet, Monitör 4 Adet, Kamera Montaj Ayağı 33 Adet	132.862,59 TL
Kara Taşıtı Alımları: Otobüs 1 Adet	186.730,03
TOPLAM HARCAMA	1.206.607,00 TL

Tablo 9/d) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Muhtelif İşler Projesi

Proje No	2010H031610
Projenin Adı	*Muhtelif İşler Projesi:*
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kullanılabilir KBÖ Gönderme	100.000,00
Kurum İçi Ödenek Aktarma	0
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0
Kullanılabilir Ödenek	100.000,00
Harcama	99.683,00
Kalan Ödenek	317,00
Nakdi Gerçekleşme%	100
Fiziki Gerçekleşme%	100

İşin Adı	Adedi	Tutarı
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler (Türkçe + Yabancı dil) Kitap alımı	3576	99.682,58 TL
TOPLAM HARCAMA	3576	99.682,58 TL

12. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2008H050160 Açık ve Kapalı Spor Salonu

Projenin 2010 yılı uygulamaları, harcamaları, nakdi ve fiziki gerçekleşme seviyesi:

Tablo 10) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No	2008H050160		
Projenin Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	1.500.000,00		
Kurum İçi Ödenek Ekleme	738.000,00		
Kullanılabilir Ödenek	2.238.000,00		
Harcama	2.237.631,00		
Kalan Ödenek	369,00		
Gerçekleşme Oranı %	100		
İşin Adı		Adedi	Tutarı
500 Seyircili Kapalı Spor Salonu		1	2.237.631,00
Diğer Açıklamalar: Üniversitemizin yatırım programında yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri işimizde, 2009 yılında başlanan 500 Seyirci Kapasiteli Kapalı Spor Salonu inşaatı tamamlanmıştır.			

Tablo 11) DKH Merkezi Araştırma Laboratuarı

Proje No	2010K121290		
Projenin Adı	Merkezi Araştırma Laboratuarı İnşaat İşi		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.300.000,00		
Kurum İçi Ödenek Ekleme	0		
Kullanılabilir Ödenek	2.300.000,00		
Harcama	344.290,00		
Kalan Ödenek	1.955.710,00		
Gerçekleşme Oranı %	15		
İşin Adı		Adedi	Tutarı
Merkezi Araştırma Laboratuarı İnşaatı Yapım İşi.		1	344.290,00
Diğer Açıklamalar: OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuarı Yapımı Ödeneği Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri tertibinde yer aldığından Bütçe Kanunu gereğince Bilimsel Araştırmaları Hesabına Yatırım Ödeneğinin tamamı olan 2.300.000 TL Aktarılmış ve emanet hesabından 344.290 TL harcanmıştır. Proje devam etmektedir.			

Tablo 12) Kamulaştırma Giderleri

Proje No			
Projenin Adı	Kamulaştırma Giderleri		
Harcamayı Yapan/Yaptıran Birim	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		
Kullanılabilir Ödenek Gönderme	2.000,00,		
Harcama	0		
Kalan Ödenek	2.000,00		
Gerçekleşme Oranı %	0		
İşin Adı		Adedi	Tutarı
		0	0
Diğer Açıklamalar: Kamulaştırma Giderleri olarak ayrılan ödenekten hiç harcama yapılmamıştır.			

Tablo 13) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Faaliyetler	Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısını 20.000'e yükseltmek
Basılı Dergi Koleksiyonu	-
Kitap Koleksiyonu	Kitap koleksiyonu için 2500 adet kitap satın almak
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloglama	-
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	10.000 adet elektronik kitabın koleksiyona eklenmesi
Kataloglama	2500 adet kataloglama yapmak
Geriye Dönük Kataloglama	1000 adet bibliyografik kaydın sisteme aktarılması

Tablo 14) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2010 Yılı Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Faaliyetler	Gerçekleşen Hedefler
Elektronik Dergi Koleksiyonu	Abonelik sayısı 10.091'e yükseltilmiştir
Basılı Dergi Koleksiyonu	-
Kitap Koleksiyonu	3576 adet kitap koleksiyona eklenmiştir.
Meslek Yüksekokul Kütüphaneleri Kataloglama	Kitap kataloglanması için herhangi bir işlem yapılamamıştır.
E-kitap Koleksiyonunun Geliştirilmesi	Elektr. Kitap koleksiyonu için herhangi bir işlem yapılamamıştır.
Kataloglama	2811 adet kitap kataloglanmıştır.
Geriye Dönük Kataloglama	2012 adet bibliyografik kayıt sisteme aktarılmıştır.

13. ÖNERİLER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde tüm yeni kurulan Üniversitelerde olduğu gibi eğitim ve öğretimin sürdürülebilmesi için her türlü açık ve kapalı alana, fiziki kapasiteye, dersliğe, idari binaya, laboratuara, sosyal alanlara, insan kaynağına ve bu ihtiyacı giderecek düzeyde mali desteğe ihtiyaç vardır.

Üniversitenin içinde kurulduğu kentte bilimsel, kültürel, ekonomik ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yönünden de katkı sağlaması gerekmektedir. Bu hizmetleri yerine getirecek her türlü donanıma sahip olması gerekmektedir. İlde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin kurulmuş olması; eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerin gelişimi yanında İlin ve bölgenin gelişimine büyük katkılar yapacak, gelişim için öncü bir rol oynayacaktır.

Osmaniye sosyal ve ekonomik altyapı itibariyle ülkemizin çoğu illerinden daha büyük bir potansiyele sahiptir. Osmaniye, bulunduğu yerin çok daha üzerinde bir konumu hak etmektedir. Osmaniye'nin, bugün sahip olduğu sosyal ve ekonomik altyapısı ile ülkemiz illeri arasındaki konumu arasında uyumsuzluk vardır. Osmaniye'nin gelişimi sahip olduğu olanaklar ölçüsünde gerçekleşememiştir. Bu durum Osmaniye halkının, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden büyük bir beklenti içerisinde olmasına neden olmaktadır. Bu beklentilerin karşılanabilmesi için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin sağlam adımlarla ilerlemesi, eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerinin yanında Osmaniye İline ve Bölgeye yeni bir açılım getirmesi, önderlik etmesi gerekmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde fiziksel altyapının geliştirilmesi hususunda yapılan çalışmalara devam edilmektedir. Teknolojik yatırımlar gelişen ve değişen modern dünyaya uyum için olmazsa olmaz şarttır. Küreselleşen dünyada değişimi seyreden değil, değişimi gerçekleştiren olmak için teknolojik altyapı ve bilişim alanında atılımlar yapılması için, Fiziksel Kapasitemizin artırılması hedefimizdir.

EK-3

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ

Bütçe Türü : Özel Bütçe
Bütçe Yılı : 2010 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2009 Sonu Kümülâtif Harcama			2010 Yılı Program Ödenek			2010 Yılı Revize Ödenek			2010 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		50200	4076	-	4076	17800	630	18430	-	-	-	13949	630	14579
Sağlık						-									
D.Kamu Hiz.	1		4000	-	-	-	2300		2300				2300	-	2300
TOPLAM	7		54200	4076	-	4076	20100	630	20730	-	-	-	16249	630	16879

EK-4

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ (BİN TL)

Kuruluş Adı : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Sektör Adı : Eğitim

2010 Kümülâtif Nakdi

BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2009	2010 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLÂTİF (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	(14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
28456	431	2010H031600	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri	Özel Bütçe	2010	Osmaniye	0	300	0	300	0	300	0	0	132	0	132
28457	431	2009H032130	Kampus Altyapısı	Özel Bütçe	2011	Osmaniye	0	10.000	54	3.000		3.000	0	0	1.482	0	1.482
28458	431	2009H032140	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2011	Osmaniye	0	30.000	3.786	10.300		10.300	0	0	8.993	0	8.993
28459	431	2009H032150	Lojman ve Sosyal Tesisler	Özel Bütçe	2010	Osmaniye	0	5.000	0	1.500		1.500	788	0	0	0	0
28460	431	2010H031610	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2010	Osmaniye	0	1.198	0	1.198	630	1.828	90	140	1.104	630	1.734
	431		Kamulaştırma Ödeneği	Özel Bütçe	2010	Osmaniye	0	2		2		2	0		0	0	0
				TOPLAM			0	46.500	3.840	16.300	630	16.930	878	140	11.711	630	12.341
SEKTÖR ADI:		SPOR															
BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2009	2010 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLÂTİF (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
		2008H050160	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2.011	Osmaniye		3.700	236	1.500		1.500		738	2.238		2.238
				TOPLAM			0	3.700	236	1.500		1.500		738	2.238		2.238
SEKTÖR ADI:		DKH															
BİM NO	YSK	PROJE NO	PROJE ADI	BÜTÇE TÜRÜ	BİTİŞ YILI	YERİ	PROJE TUTARI		2009	2010 ÖDENEK			AKTARMA		HARCAMA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	DIŞ (8)	TOPLAM (9)	KÜMÜLÂTİF (10)	DIŞ KREDİ (11)	ÖZKAYNAK (12)	TOPLAM (13)	+ , - (14)	MİKTARI (15)	DIŞ KREDİ (16)	ÖZKAYNAK (17)	TOPLAM (18)
29765	431	2010K121290	Merkezi Araştırma Lab.	Özel Bütçe	2012	Osmaniye	0	4.000	0	2.300	0	2.300	0	0	2.300	0	2.300
				TOPLAM			0	4.000		2.300		2.300	0	0	2.300		2.300
GENEL TOPLAM							0	54.200	4.076	20.100	630	20.730	878	878	16.249	630	16.879
